

Città di PADULA

Provincia di Salerno

CRONOPROGRAMMA


OGGETTO: Lavori di costruzione della palestra della scuola elementare in località Cardogna


COMMITTENTE: Comune di Padula

Padula, 21/05/2019

Il Tecnico
(Ing. Michele TAMBURINI)

ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5			
				s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20
1	STRUTTURE DI FONDAZIONE	45 g	75 203.41																				
2	Scavi rinterrì e trasporti	7 g	10 304.40																				
3	Struutre di fondazione	39 g	64 899.01																				
4	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	81 g	137 700.62																				
5	Strutture prefabbricate (pilastri - travi)	39 g	55 976.27																				
6	Pannellature	27 g	56 306.64																				
7	Tamponature e coperture	27 g	16 586.86																				
8	Solaio	17 g	8 830.85																				
9	OPERE DI SOTTOPAVIMENTAZIONE	31 g	37 024.96																				
10	Scavi rinterrì e trasporti	5 g	6 458.21																				
11	Vespaio	22 g	12 450.24																				
12	Massetto	13 g	18 116.51																				
13	OPERE DI PAVIMENTAZIONE	33 g	23 103.68																				
14	Pavimenti e rivestimenti	33 g	23 103.68																				
15	OPERE EDILI	43 g	42 161.80																				
16	Murature - intonaci - pareti	19 g	12 424.96																				
17	Infissi	35 g	29 736.84																				
18	IMPIANTO IDRICO SANITARIO E SCARICO	13 g	6 354.89																				
19	IMPIANTO ELETTRICO	11 g	5 160.33																				
20	IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO	20 g	17 125.51																				
21	SMOBILIZZO CANTIERE	3 g	0.00																				

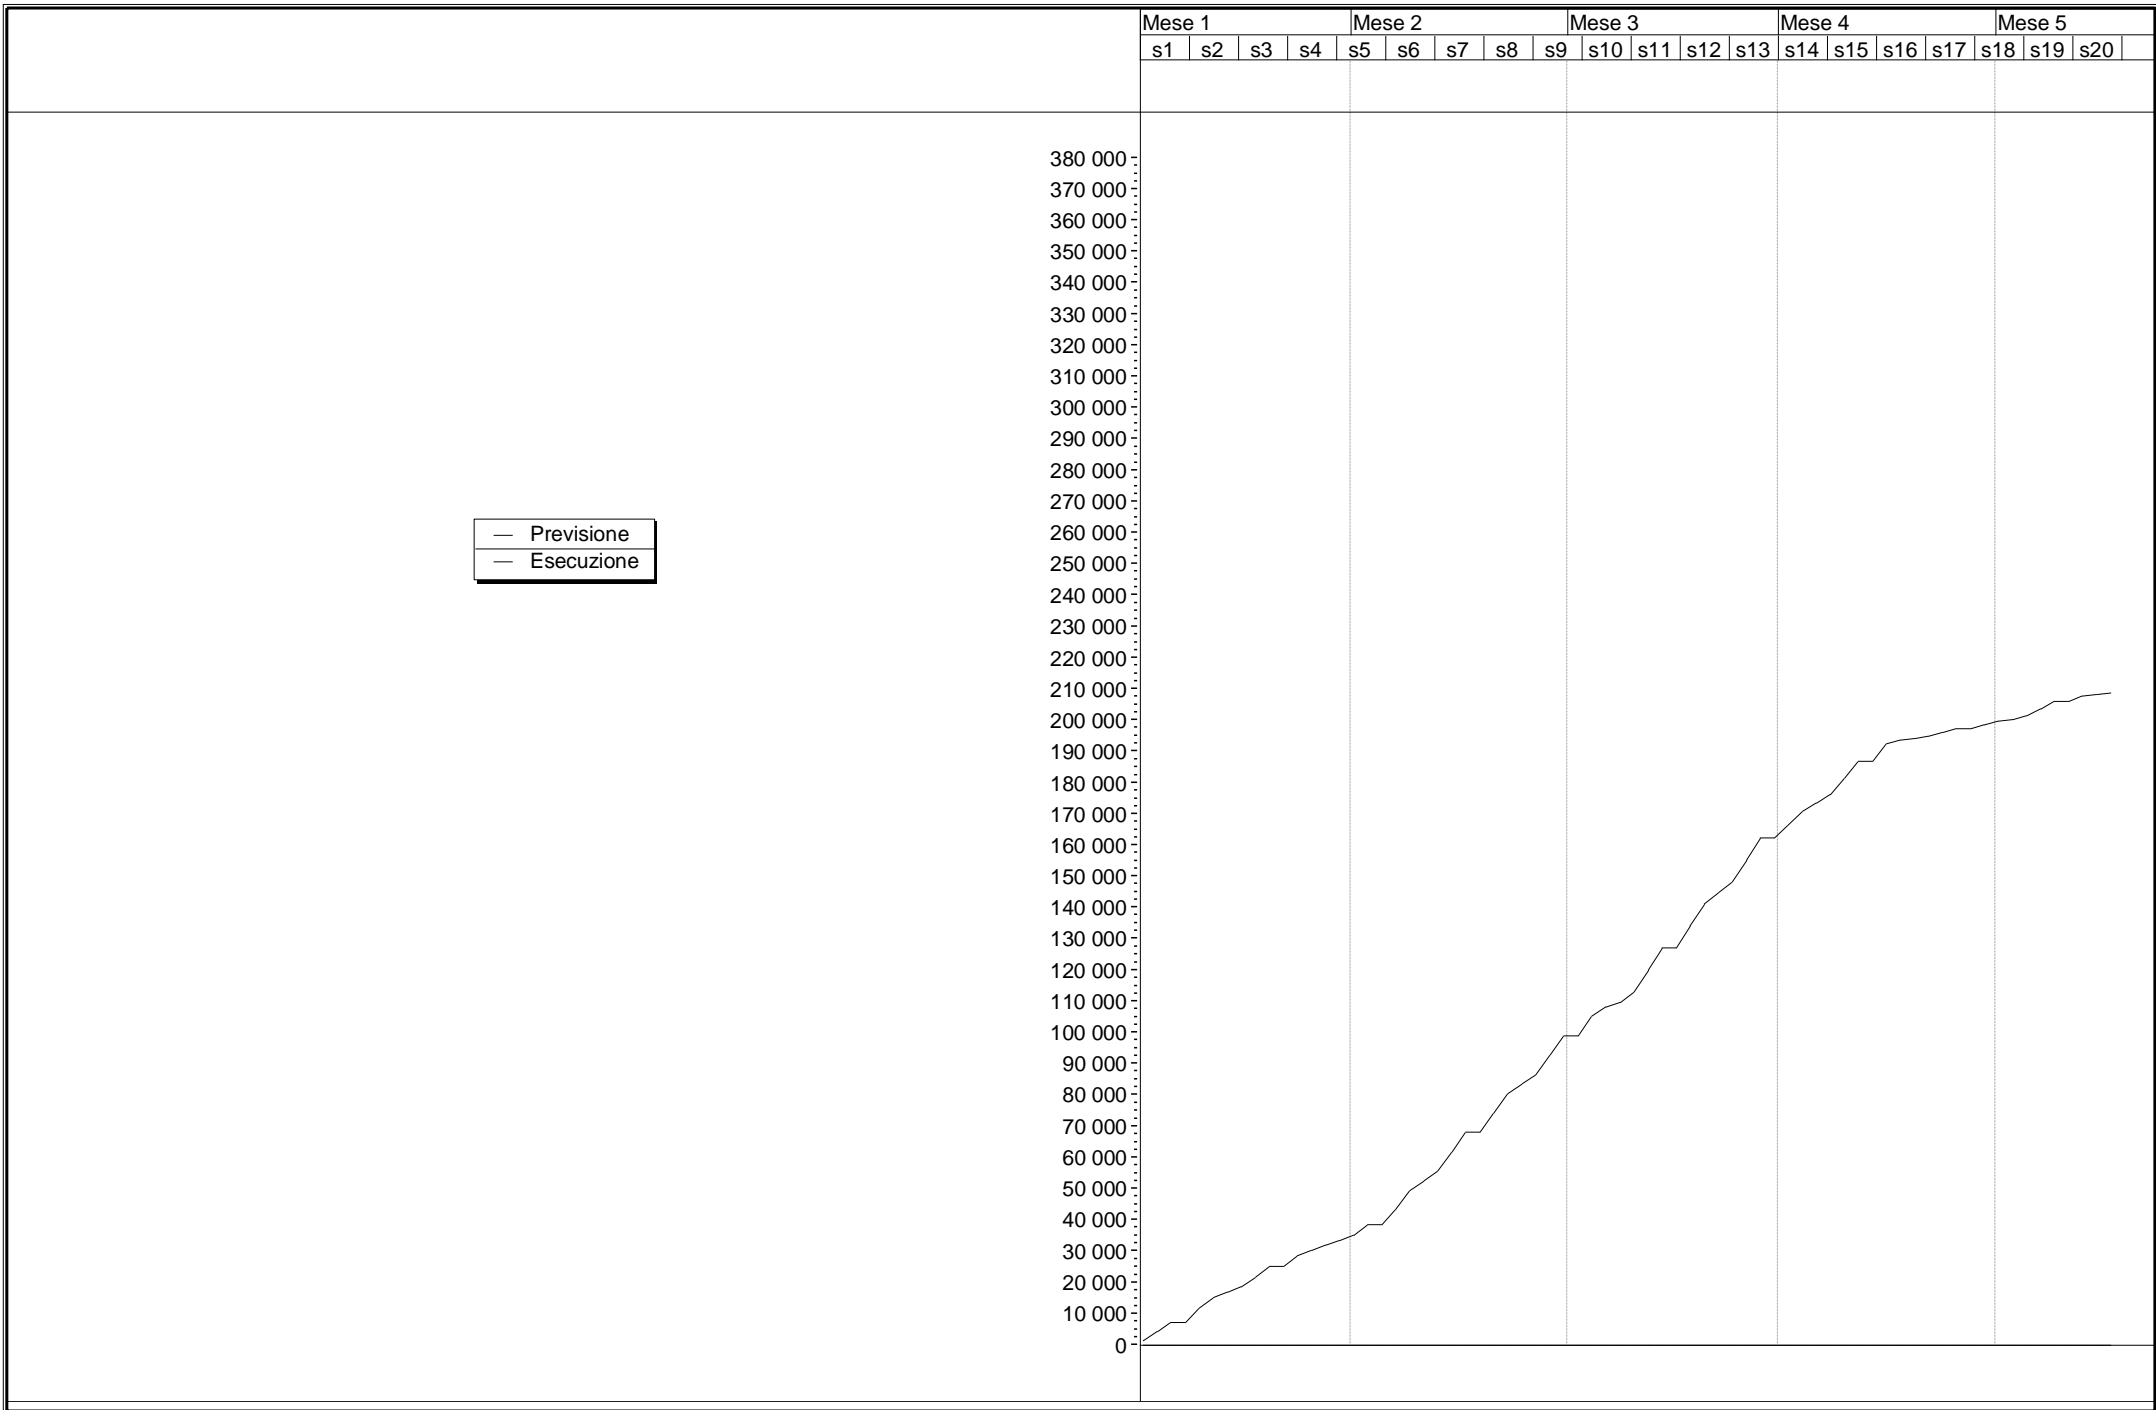

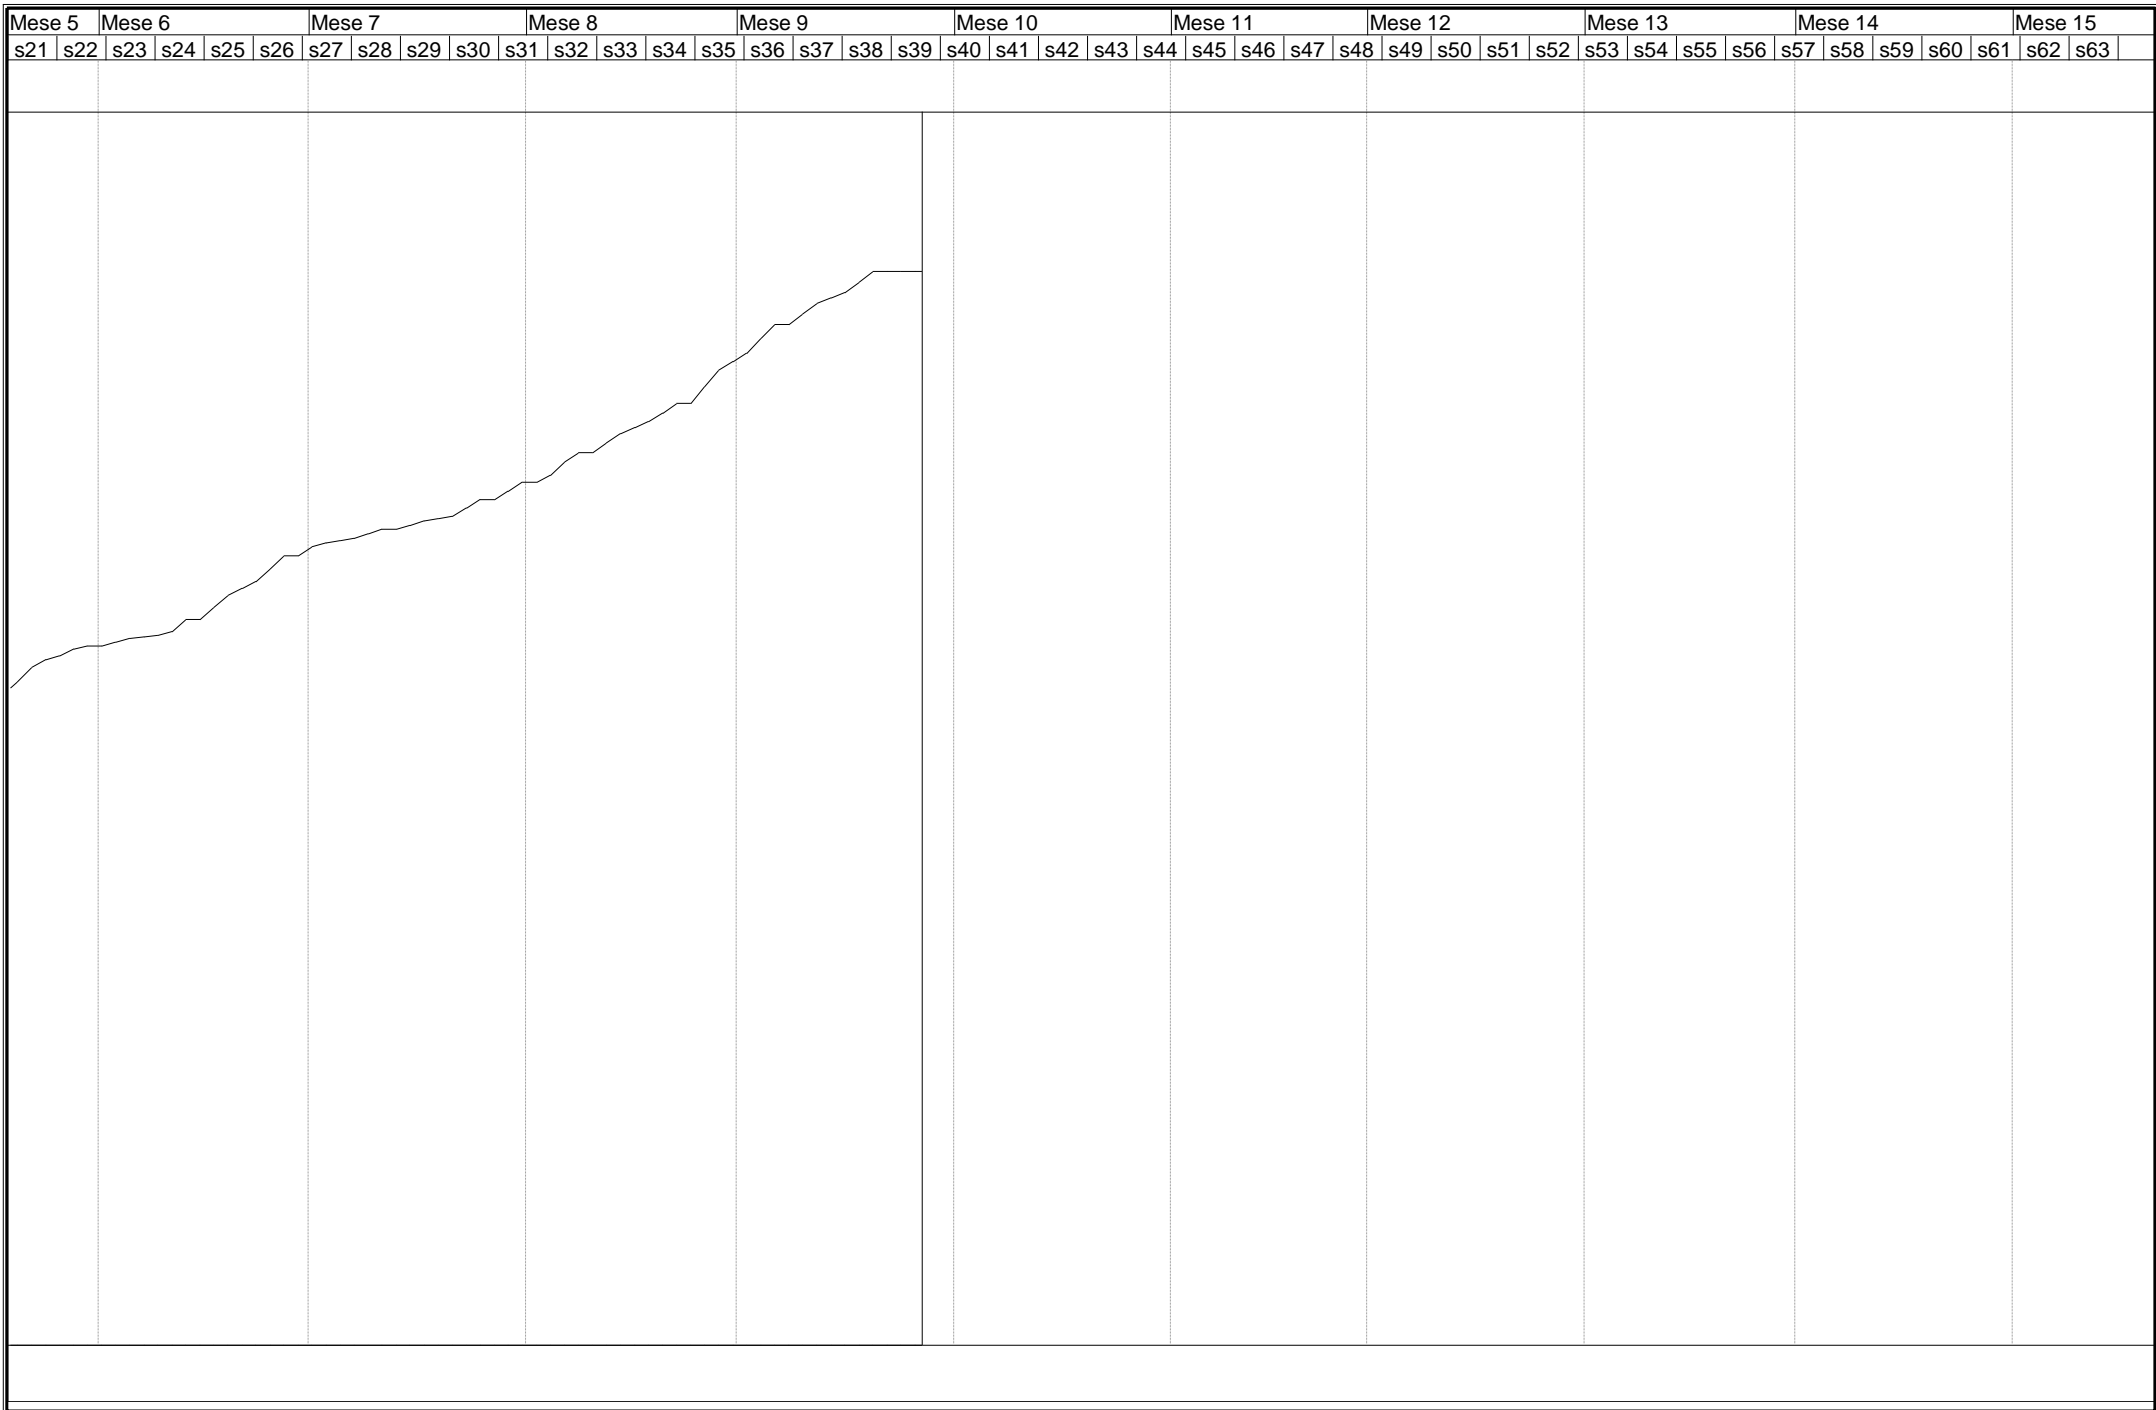

Città di PADULA

Provincia di Salerno

Tabella Attività

OGGETTO: Lavori di costruzione della palestra della scuola elementare in località Cardogna

COMMITTENTE: Comune di Padula

Padula, 21/05/2019

Il Tecnico
(Ing. Michele TAMBURINI)
